



# BIOMETRIA

Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Kommunikationsmaterial del 2







# Introduktion till Omläggning




## Vi närmar oss Go Live för VIOL 3

- » Vi vill uppmärksamma dig på att det är **dags att börja planera din verksamhet** inför Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2
- » I det här materialet hittar du följande avsnitt:
  - » **Omläggning** – vad innebär det?
  - » **Verksamhetsplanering** – viktigt att göra inför omlägningsperioden
  - » **Regler och principer** – under omlägningsperioden
  - » **Guide Verksamhetsplanering** – en guide till stöd för omlägningsplanering
  - » **Begränsa VIOL 2** – viktiga datum och vad det innebär under omlägningsperioden
  - » **Inför och i samband med Go Live** – viktiga aktiviteter och datum
- » Kommunikation kommer att ske löpande fram till dess att VIOL 2 stängs




# Övergripande plan

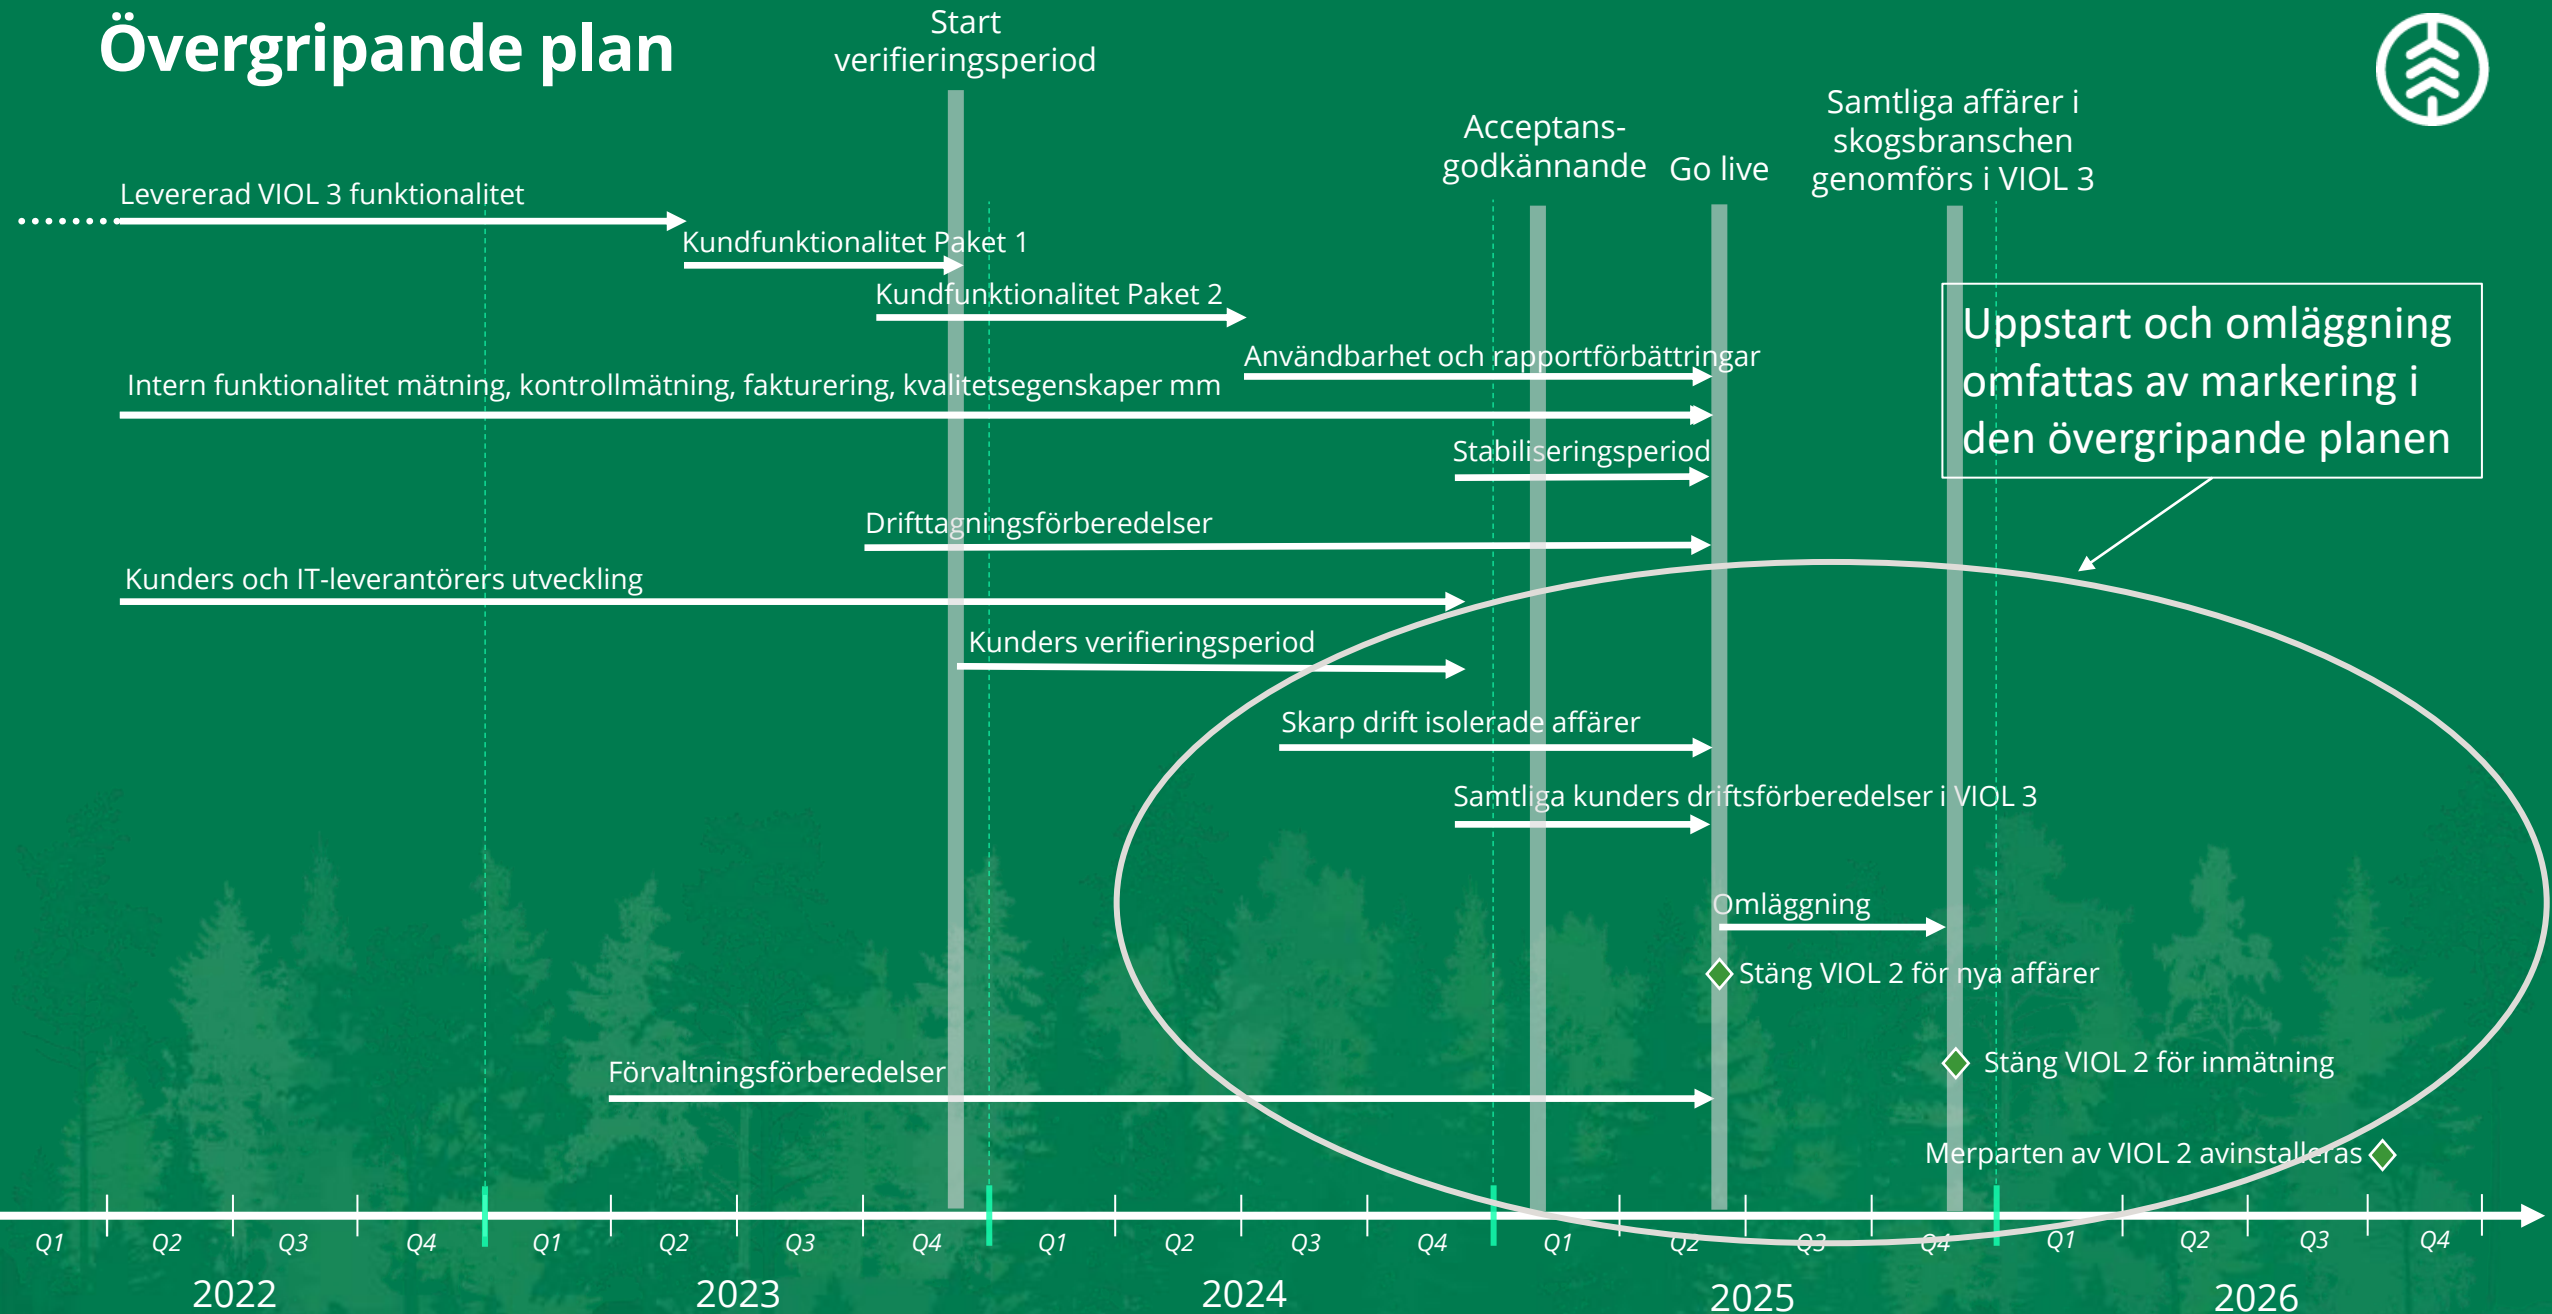



## Vad innebär omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

- » Din organisation ska flyttas från VIOL 2 till VIOL 3 under Omläggningsperioden, som är ca 6 månader från och med Go Live av VIOL 3
- » Syftar till att **så snart som möjligt** avsluta och slutredovisa affärer som baseras på regelverken i VIOL 2 och **så snart som möjligt** starta upp affärer i VIOL 3

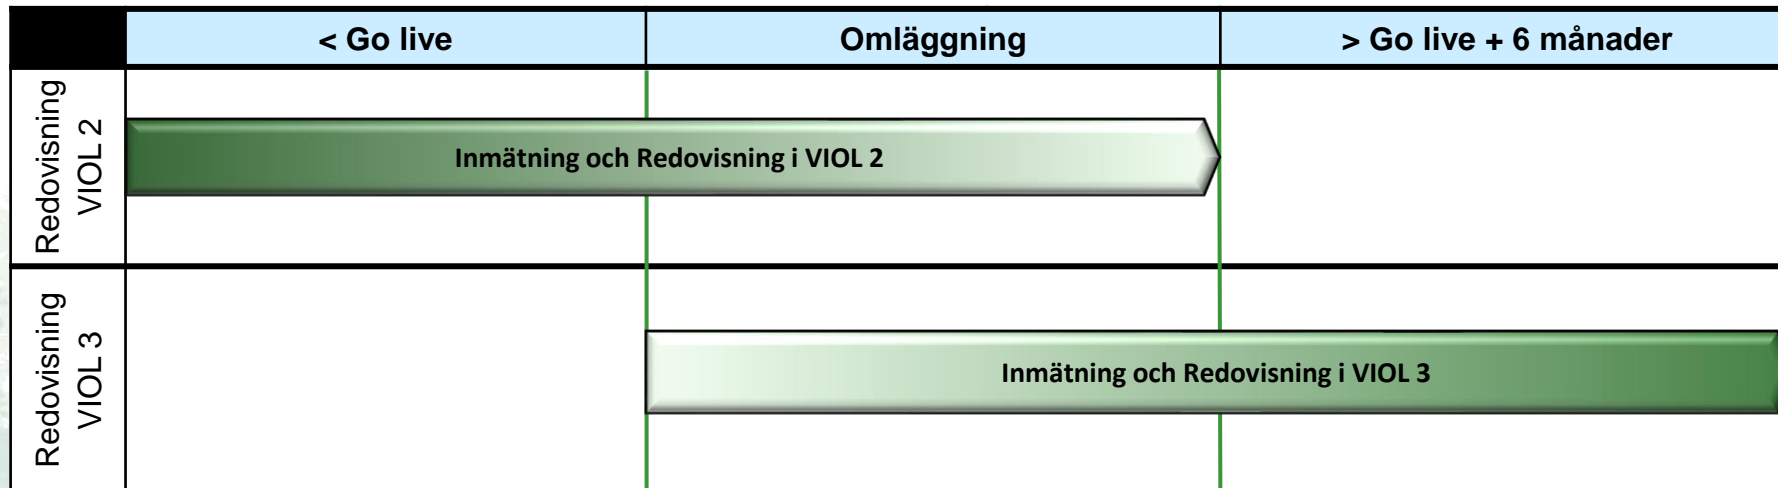



## Viktigt att veta för Omläggning

- » Planeringen för omlägningsperioden startar redan nu och som kund behöver du säkerställa övergången till VIOL 3 för dig och dina affärspartners
- » Under Omlägningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 vara i drift samtidigt
- » Viktigt att säkerställa att era verksamhetssystem kan hantera pågående affärer i VIOL 2 och VIOL 3 samtidigt under omlägningsperioden
- » VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är två helt skilda system





# Verksamhetsplanering inför omläggning



# Viktigt att göra inför Omläggning

Aktiviteter som du som kund behöver ta ansvar för att:

- » **Skapa en omlägningsplan** genom att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras från Go Live och under Omlägningsperioden, önskat måldatum för omlägningsplanen är 2024-09-30. Mall för omlägningsplan kommer under april 2024.
  - » Vilka affärer som planeras att slutföras i VIOL 2
  - » Vilka affärer som ska starta direkt i VIOL 3
  - » Vilka affärer som eventuellt behöver läggas upp på nytt i VIOL 3
  - » Vilka affärspartners ni arbetar med
  - » Vilka roller ni har i förhållande till era affärspartners
  - » Hur status är för era affärspartners gällande omlägningsarbetet inför VIOL 3
- » Kontakta din affärskonsult eller Biometria support om du har eventuella frågor och funderingar



# Plan för organisationsstruktur i VIOL 3 | Milstolpe 5a



- » Planera för din organisationsstruktur i VIOL 3
  - » Besluta om er organisationsstruktur behöver förändras i VIOL 3
  - » I VIOL 3 tillåts endast en huvudkod per organisationsnummer
  - » Finns fler än en huvudkod i VIOL 2, bestäm vilken av dessa du vill behålla i VIOL 3
- » Mall för organisationsstruktur finns på [biometria.se](https://biometria.se)
- » Organisationsstrukturen har beroenden till:
  - » Plats/Mätplats/Mottagningsplats
  - » Avtalsobjekt/Förstaledskontrakt/Köparekontrakt
  - » Redovisningshänvisning
  - » Kollektiv
  - » Certikonto



## Plan för sortimentsstruktur | Milstolpe 5b

- » Besluta hur du vill nyttja sortimentsstrukturen i VIOL 3
- » Förändringar av sortimentsstrukturen i VIOL 3 innebär behov att se över hur det påverkar den egna verksamheten och affärspartners
- » Mall för sortimentstruktur finns på [biometria.se](https://biometria.se)







## Plan för platsstruktur | Milstolpe 5c

- » Som kund behöver du ta ställning till hur du vill nyttja platsstrukturen i VIOL 3
- » Förändringar av platsstrukturen i VIOL 3 innebär behov att se över hur det påverkar den egna verksamheten och affärspartners
- » Mall för platsstruktur finns på [biometria.se](https://biometria.se)





# Mall för verksamhetsplanering

- » Forest Storm har skapat en mall till stöd för kunderna gällande verksamhetsplanering för:
  - » Organisationsstruktur
  - » Sortimentsstruktur
  - » Platsstruktur
- » [Mallen finns här](#)





# Plan för behörigheter

- » Planera för beställning av behörigheter till alla användare i VIOL 3, ta ställning till vilken roll/roller respektive användare ska ha
- » Du kan läsa mer om roller/rollpaket i VIOL 3 på [biometria.se](https://biometria.se)
  - » [Behörigheter i VIOL 3](#)
  - » [Översikt BI-rapporter + behörighet och rollpaket](#)
  - » [Nya rollpaket inklusive fullmakter](#)



# Viktiga datum Omlägningsplanering

Milstolpe	Beskrivning	Start datum	Slut datum
Kund kan beställa grunduppsättning av data	Du som kund får möjlighet att beställa grunduppsättning av data. Information om vilken typ av grunduppsättning som ska beställas i första hand kommer att publiceras ca 2 veckor innan beställningsmöjlighet öppnas.	April 2024	
Omlägningsplan	Som kund behöver du ha en omlägningsplan klar. Milstolpe 7 a, som innebär att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras vid Go Live och den kommande omlägningsperioden.	Så snart som möjligt	2024-09-30
Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3	Det innebär att alla som beställt grunduppsättning av data och behörighet får tillgång till VIOL 3 och kan påbörja arbetet med att skapa sina affärsdata så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor, avtalsobjekt osv.	2024-12-02	
Redo för Go Live	All affärsdata ska vara uppsatt och registrerad i VIOL 3, Milstolpe 10.	2024-12-02	2025-04-02
Go Live VIOL 3	Den dagen vi öppnar upp VIOL 3 i skarp drift för alla kunder	2025-05-02	
Omläggning	Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 kommer att ske	2025-05-02	2025-10-31
VIOL 2 stängs för nya affärer	Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN Det går fortsatt att lägga till nya rader i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i transportaffären.	TBD	
Sista inleveransdag VIOL 2	Sista dag att leverera råvara VIOL 2		2025-10-17
Sista inmättningsdag VIOL 2	Sista dag att mäta in råvara VIOL 2		2025-10-31





# Regler och principer för omläggning



## Principer för omläggning | 1 av 2

- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering för VIOL 2 är 2025-10-17
- » VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31
- » Det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning av råvara:
  - » DORIS
  - » IRIS (fjärrmätning)
  - » MAPP
  - » RTV-Online
  - » Extern insändning
  - » Rätta/Korrigera
  - » Ers. grundande skördarmätning
- » Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2






## Principer för omläggning | 2 av 2

- » Pågående affärer i VIOL 2 ska redovisas klart i VIOL 2 **så snart som möjligt** under Omläggningsperioden, som pågår ca 6 månader efter Go Live
- » Affärer kan påbörjas i VIOL 3 från och med Go Live
- » Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen



# Regler för utforsling av Virke | 1 av 2

## Växtskyddslagstiftningen

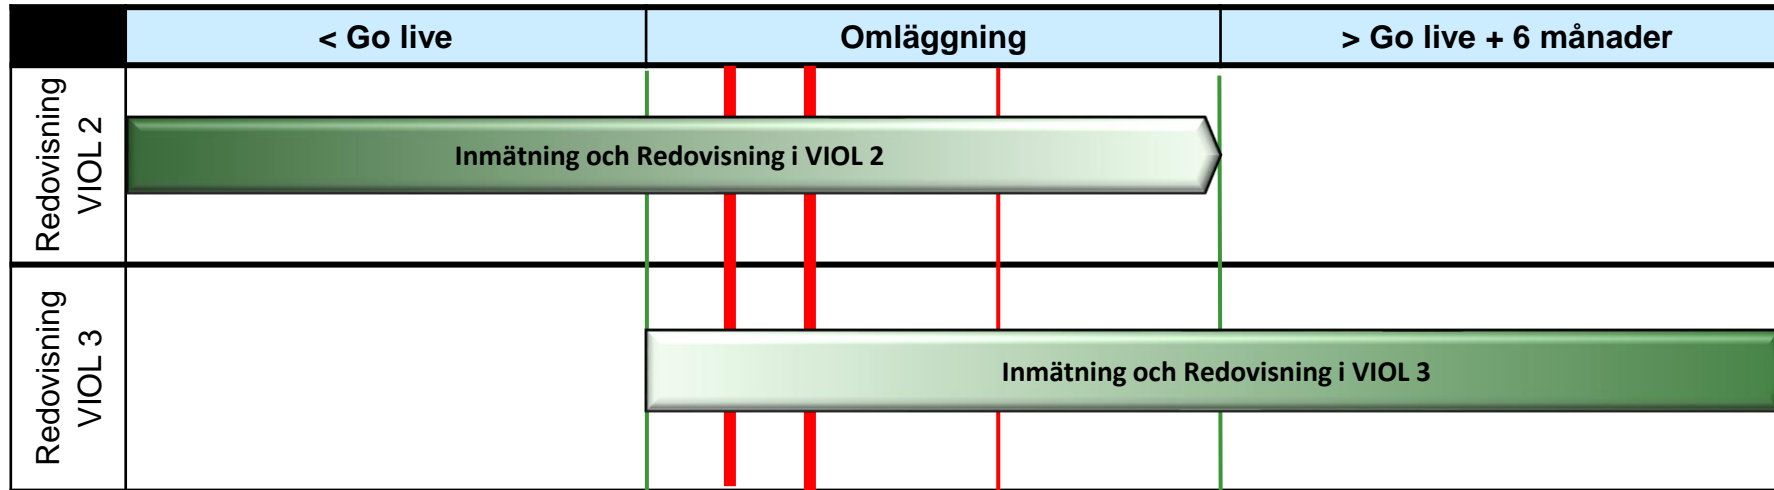

### Regler för utforsling av virke i område söder

- Virke som avverkats eller skadats **före 1 juni** måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast **1 juli**.
- För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast **1 augusti**. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast **1 september**.

### Regler för utforsling av virke i område norr

- Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast **15 juli**.
- För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden **15 juni – 15 juli** måste forslas bort senast **15 augusti**.

Reglerna för utforsling av Virke sätter naturliga gränser för att avsluta affärerna i VIOL 2



## Regel: Samlast och samlastredovisning under omlägningsperioden | 2 av 2

- » VIOL 2 och VIOL 3 är **helt skilda system** och det finns ingen överföring av information mellan systemen
- » Transporter med leveranser för både VIOL 2 och VIOL 3 **kan inte samlastredovisas**
- » Ett transporttillfälle där samtliga leveranser ingår i VIOL 2 kan samlastredovisas
- » Ett transporttillfälle där samtliga leveranser ingår i VIOL 3 kan samlastredovisas

### Samlastredovisning innebär att systemet ger:

- Möjlighet till speciell avståndprioritering för samlastade leveranser
- Eventuellt tillägg för lastutfyllnad tar hänsyn till lassets totala kvantitet och fördelar tillägget på de ingående leveranserna.
- Eventuellt avdrag för övervikt tar hänsyn till lassets totala vikt och fördelar avdraget på de ingående leveranserna.



## Exempel med samlast med samlastredovisning under omläggningen







# Guide för verksamhetsplaneringen inför omläggning



## Guide – Verksamhetsplanering | 1 av 9

- » Från och med Go Live 2025-05-02 för VIOL 3 innebär det att **så snart som möjligt förflytta** din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3
- » Verksamhetsplanen måste ta hänsyn till att omlägningsperioden är från Go Live 2025-05-02 till 2025-10-31
- » VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, för att mätningorganisationen ska få möjlighet att mäta in all råvara kopplad till VIOL 2
- » VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning
- » Omlägningsplanen omfattar hur du vill hantera:
  1. Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live
  2. Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina respektive kontrakt
  3. Affärer som inte hinner avslutas under omlägningsperioden i VIOL 2
  4. Affärer med bränslesortiment kan behöva läggas upp på nytt i VIOL 3






## Guide - Engagera verksamheten | 2 av 9

- » Viktiga roller i verksamheten som behöver engageras:
  - » Virkesadministratörer
  - » Avtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)
  - » Produktionsledare
  - » Transportledare
- » Pågående avtal som levereras efter 2025-10-17 behöver läggas upp på nytt i VIOL 3
- » Avsluta era affärer i VIOL 2 efter 2025-10-17 innebär att:
  - » Justeringar på råvarupriser kan komma efter att VIOL 2 stängts för inmätning
  - » Eventuella avvisade mätningar kommer behöva hanteras i VIOL 2 fram till 2026-01-31
  - » Mätbesked kommer skickas ut när allt har korrigerats och prisräknats en sista gång fram till 2026-01-31
- » Omlägningsperioden innebär att överenskomna försörjningsåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 och VIOL 3






# Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 3 av 9

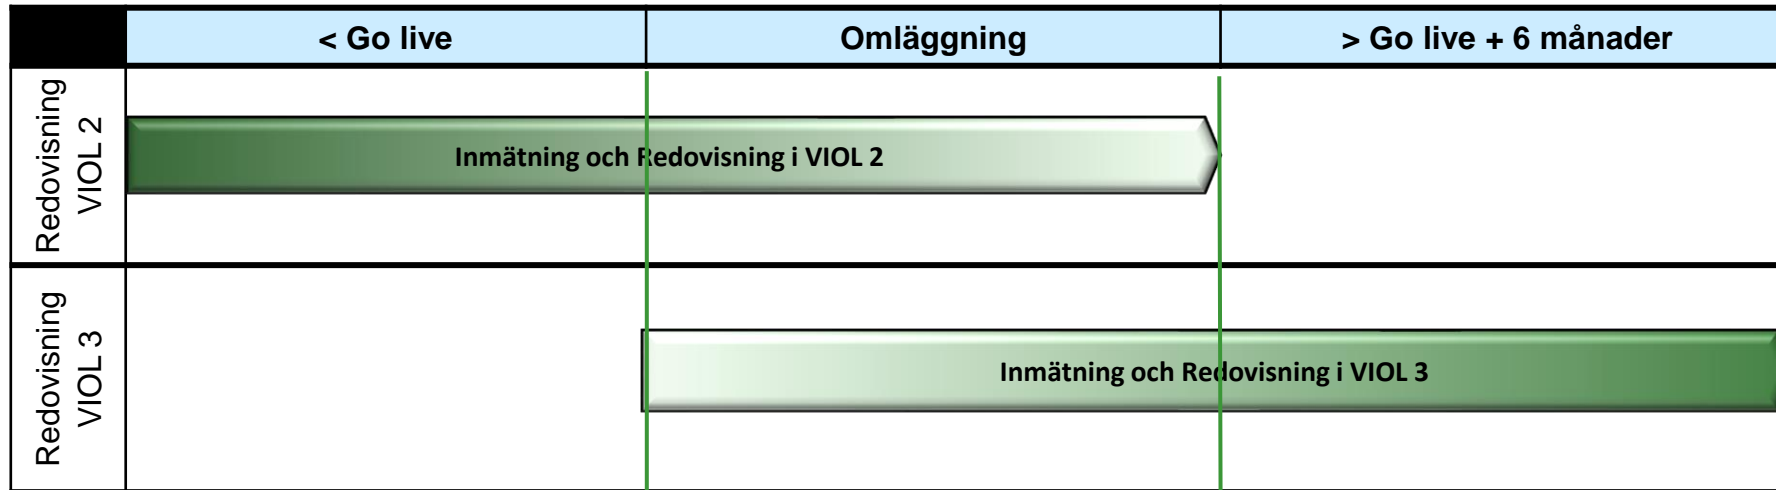

- » Vid leverans av råvara kan mätresultatet komma att påverkas olika beroende på vilket system det mäts in i.
  - » Mätningar från VIOL 2 kommer att hanteras med Förstaledskontrakt, Virkesorder och övriga affärsobjekt i VIOL 2 och för aktuell tid gällande prisuppgörelser.
  - » Mätningar från VIOL 3 den nya strukturen med Avtalsobjekt och dess tillhörande kontraktsdelar och nya prisobjekt för samma leveranstidpunkt som i VIOL 2
- » Mindre avvikelser kan eventuellt förekomma vid leveranser inom affärsflöden som innefattar samma parter som redovisas i både VIOL 2 och VIOL 3.

# Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 4 av 9

## Förhållandet till Kollektiv

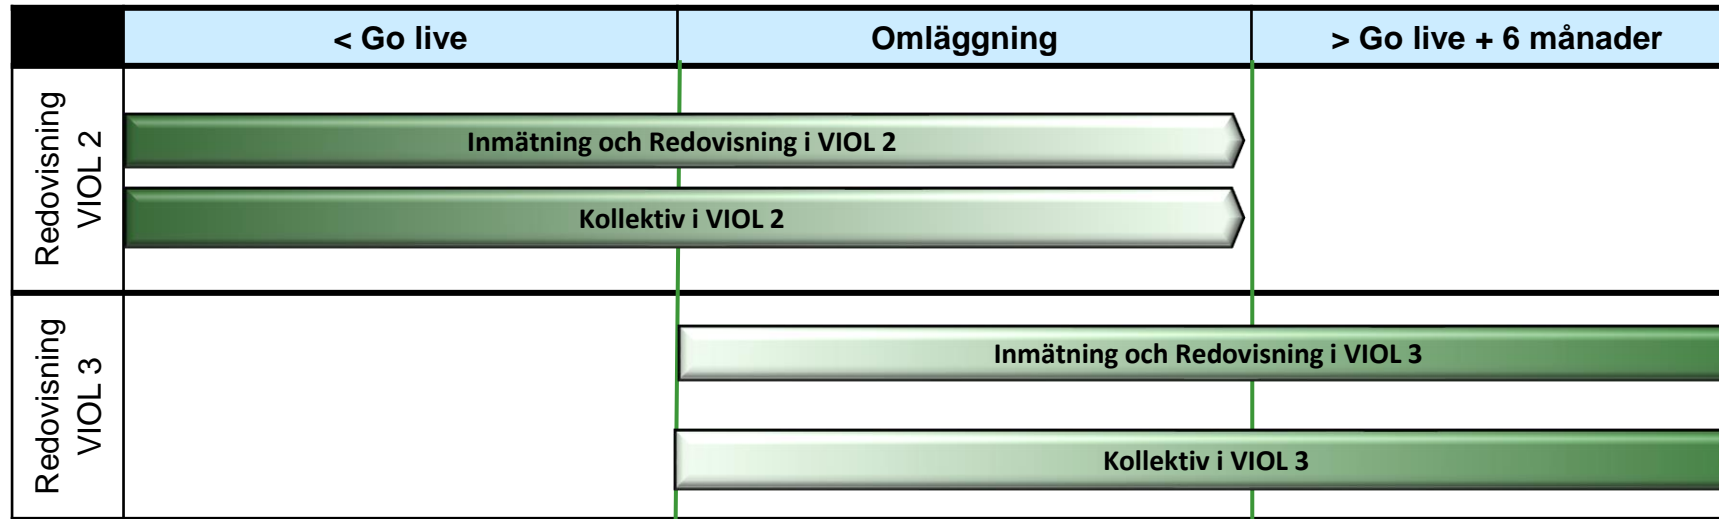

- » Vid inmätning av råvara som omfattas av Kollektiv kommer mätresultatet att påverkas olika beroende på vilket system det mäts in i.
  - » Mätningar från VIOL 2 kommer att påverkas av stickprover från en längre tid tillbaka och skapa omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde.
  - » Mätningar från VIOL 3 kommer att påverkas av bedömda basomräkningstal och från succesivt utfallna stickprover som skapar nya omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde.
- » Kollektivens kvantitet och eventuellt värde kommer därvid att vara olika vid leveranser som innefattar samma affärsflöde men i olika system.

# Guide - Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live | 5 av 9



Från

Till

Sågverk



Sågverk



Massabruk



Terminal



Terminal



Import eller Inhemska  
leveranser på fartyg/tåg



Värmeverk



- Terminal till egen industri
- Sågverksflis till massabruk
- Egen import på båt och tåg
- Affärer med få affärsled





Från

Sågverk



Terminal



Avverkningsplats



Till

Sågverk



Massabruk



Terminal



Värmeverk



- Planera med affärspartners i dina kontraktskedjor
- Alla ingående parter måste ha sin organisationsstruktur upplagd i VIOL 3
- Platsstrukturen för mottagande industri måste var upplagd i VIOL 3
- Ta hänsyn till att planerade avverkningar i VIOL 2 klarar omlägningsperioden på ca 6 månader



## Guide - planera drivning | 7 av 9

- » Produktionsrapportering i VIOL 3 är möjligt från 2025-05-02 (Go live)
- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 och därför bör ersättningsgrundande skördarmätning, avverkning och produktionsrapportering av trakter i VIOL 2 vara klara i god tid innan dess
- » Trakter i VIOL 2 som hinner bli klara före eller närtid efter Go Live kan startas i VIOL 2
- » Trakter i VIOL 2 som **inte** hinner blir klara under omlägningsperioden – ta ställning till om du kan avvakta till Go Live för VIOL 3 eller dela upp trakten i mindre avdelningar (lägg upp trakten i både VIOL 2 och VIOL 3)



## Guide - planera skogsbränsle | 8 av 9

- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17
- » Skogsbränslen har längre ledtid än övriga sortiment (ligger och torkar i skogen)
- » Om intransporten av bränsledelen från trakten kommer ske efter 2025-10-17 behöver denna del av affären läggas upp i VIOL 3
- » Rundvirkesdelen redovisas och följs därmed upp i VIOL 2 och skogsbränsledelen i VIOL 3





## Guide - planera logistik | 9 av 9


- » Kör klart VIOL 2 affärer **så tidigt som möjligt** under omlägningsperioden
- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara i VIOL 2 är 2025-10-17
- » Säkerställ att dina affärspartners för transport och deras chaufförer är redo för VIOL 3
- » I leveransprocessen ska det vara **tydligt för chauffören** om det är VIOL 2 eller VIOL 3 råvara som ska lastas, transporteras och levereras
- » Samlastredovisning mellan VIOL 2 och VIOL 3 är **inte möjligt**
- » Principer för samtransporter av VIOL 2 råvara och VIOL 3 råvara kommer under april 2024



# Begränsa VIOL 2




# Övergripande plan VIOL 3

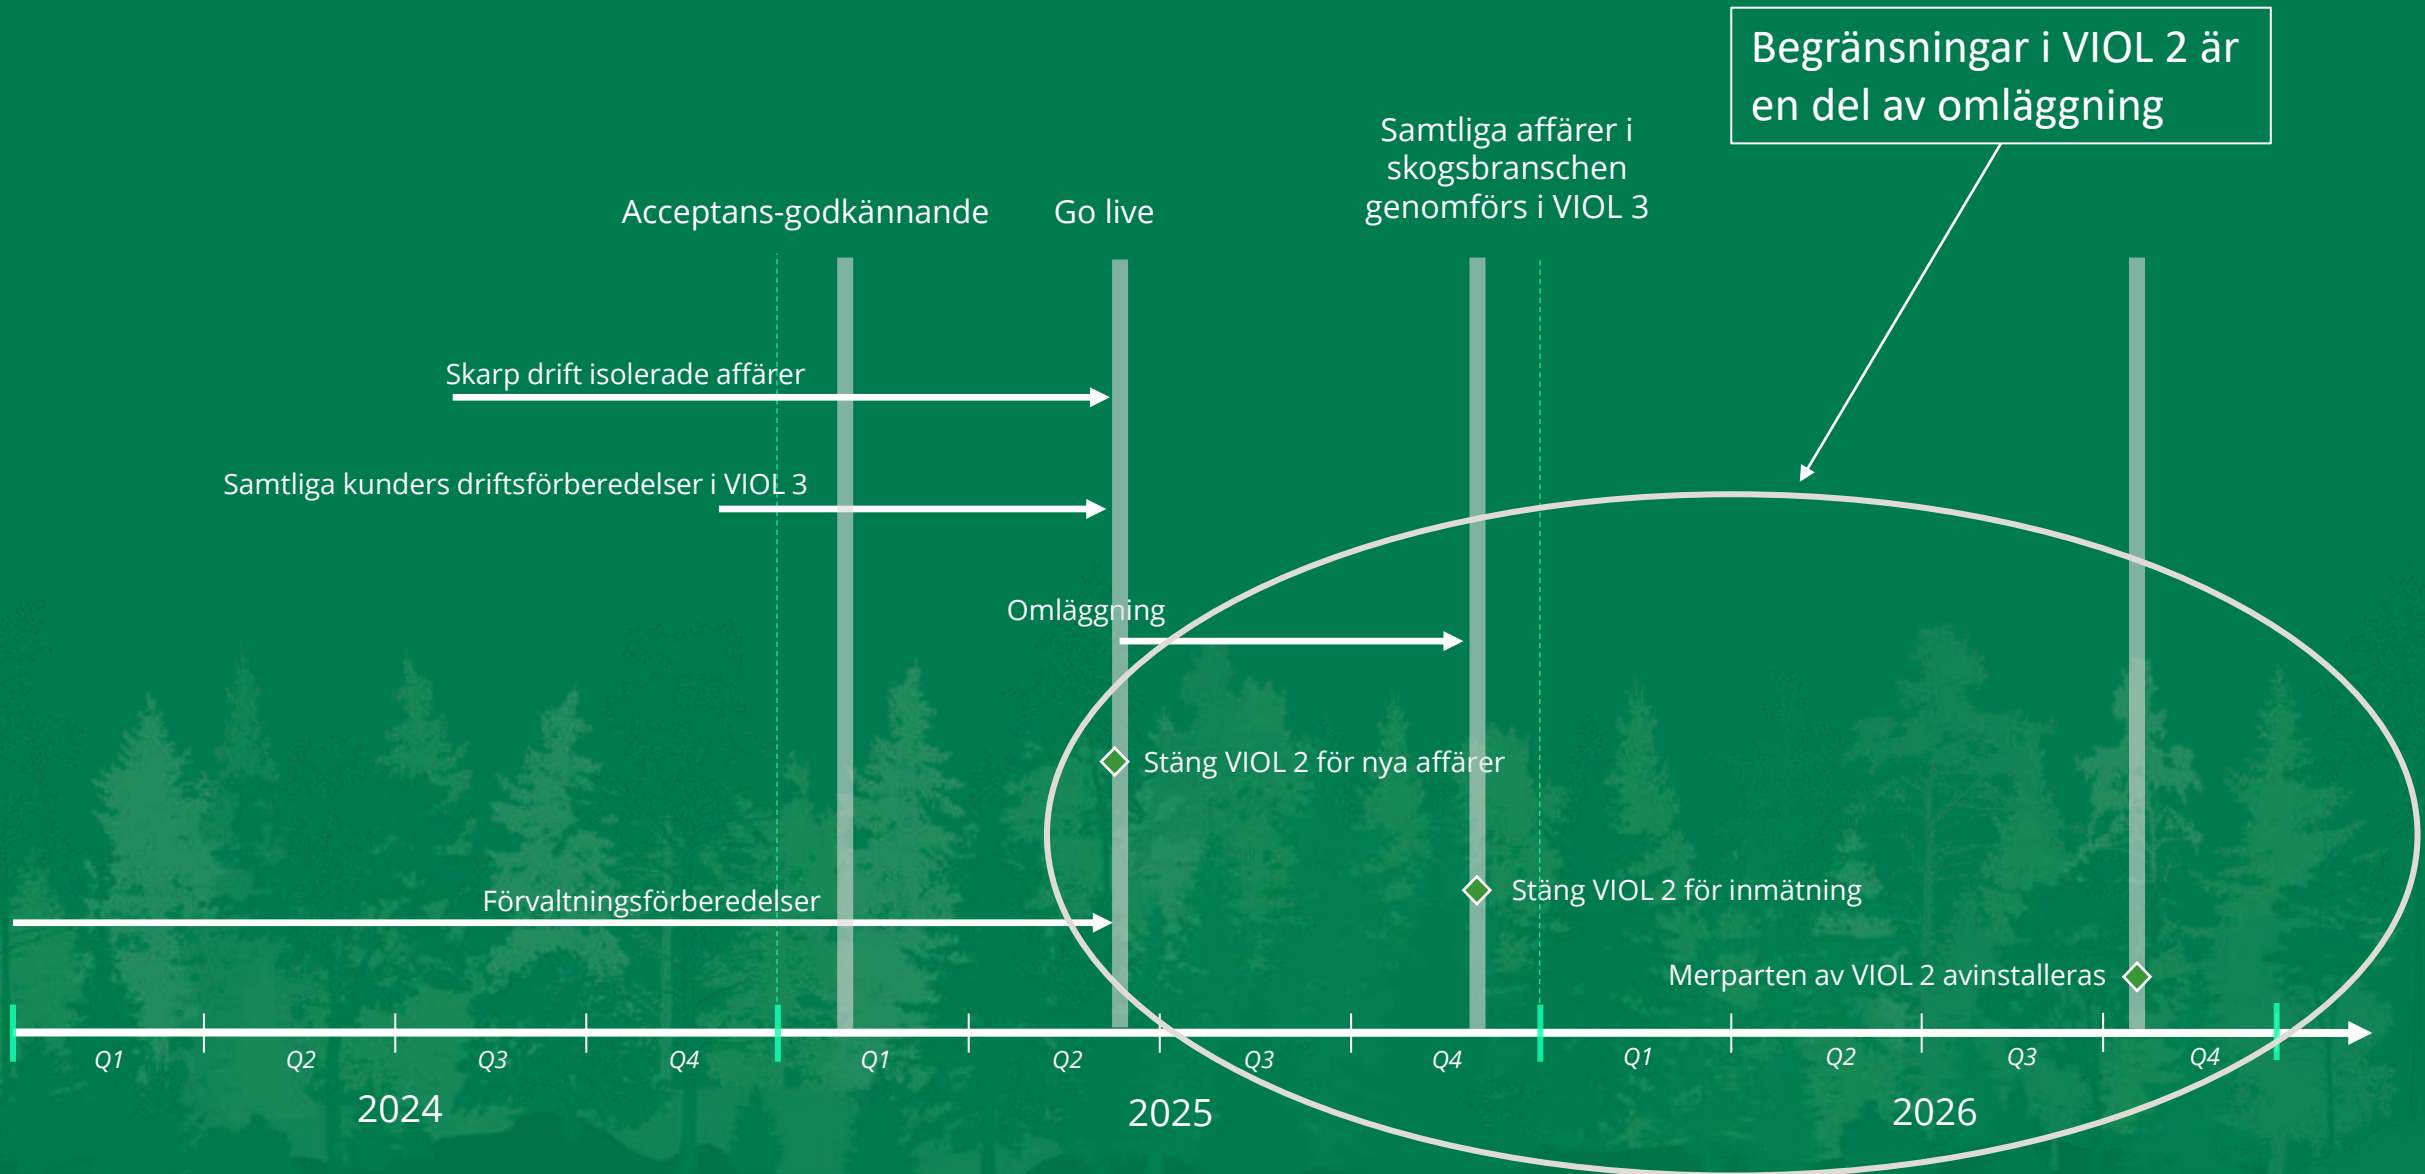



# Tidslinje begränsning av VIOL 2

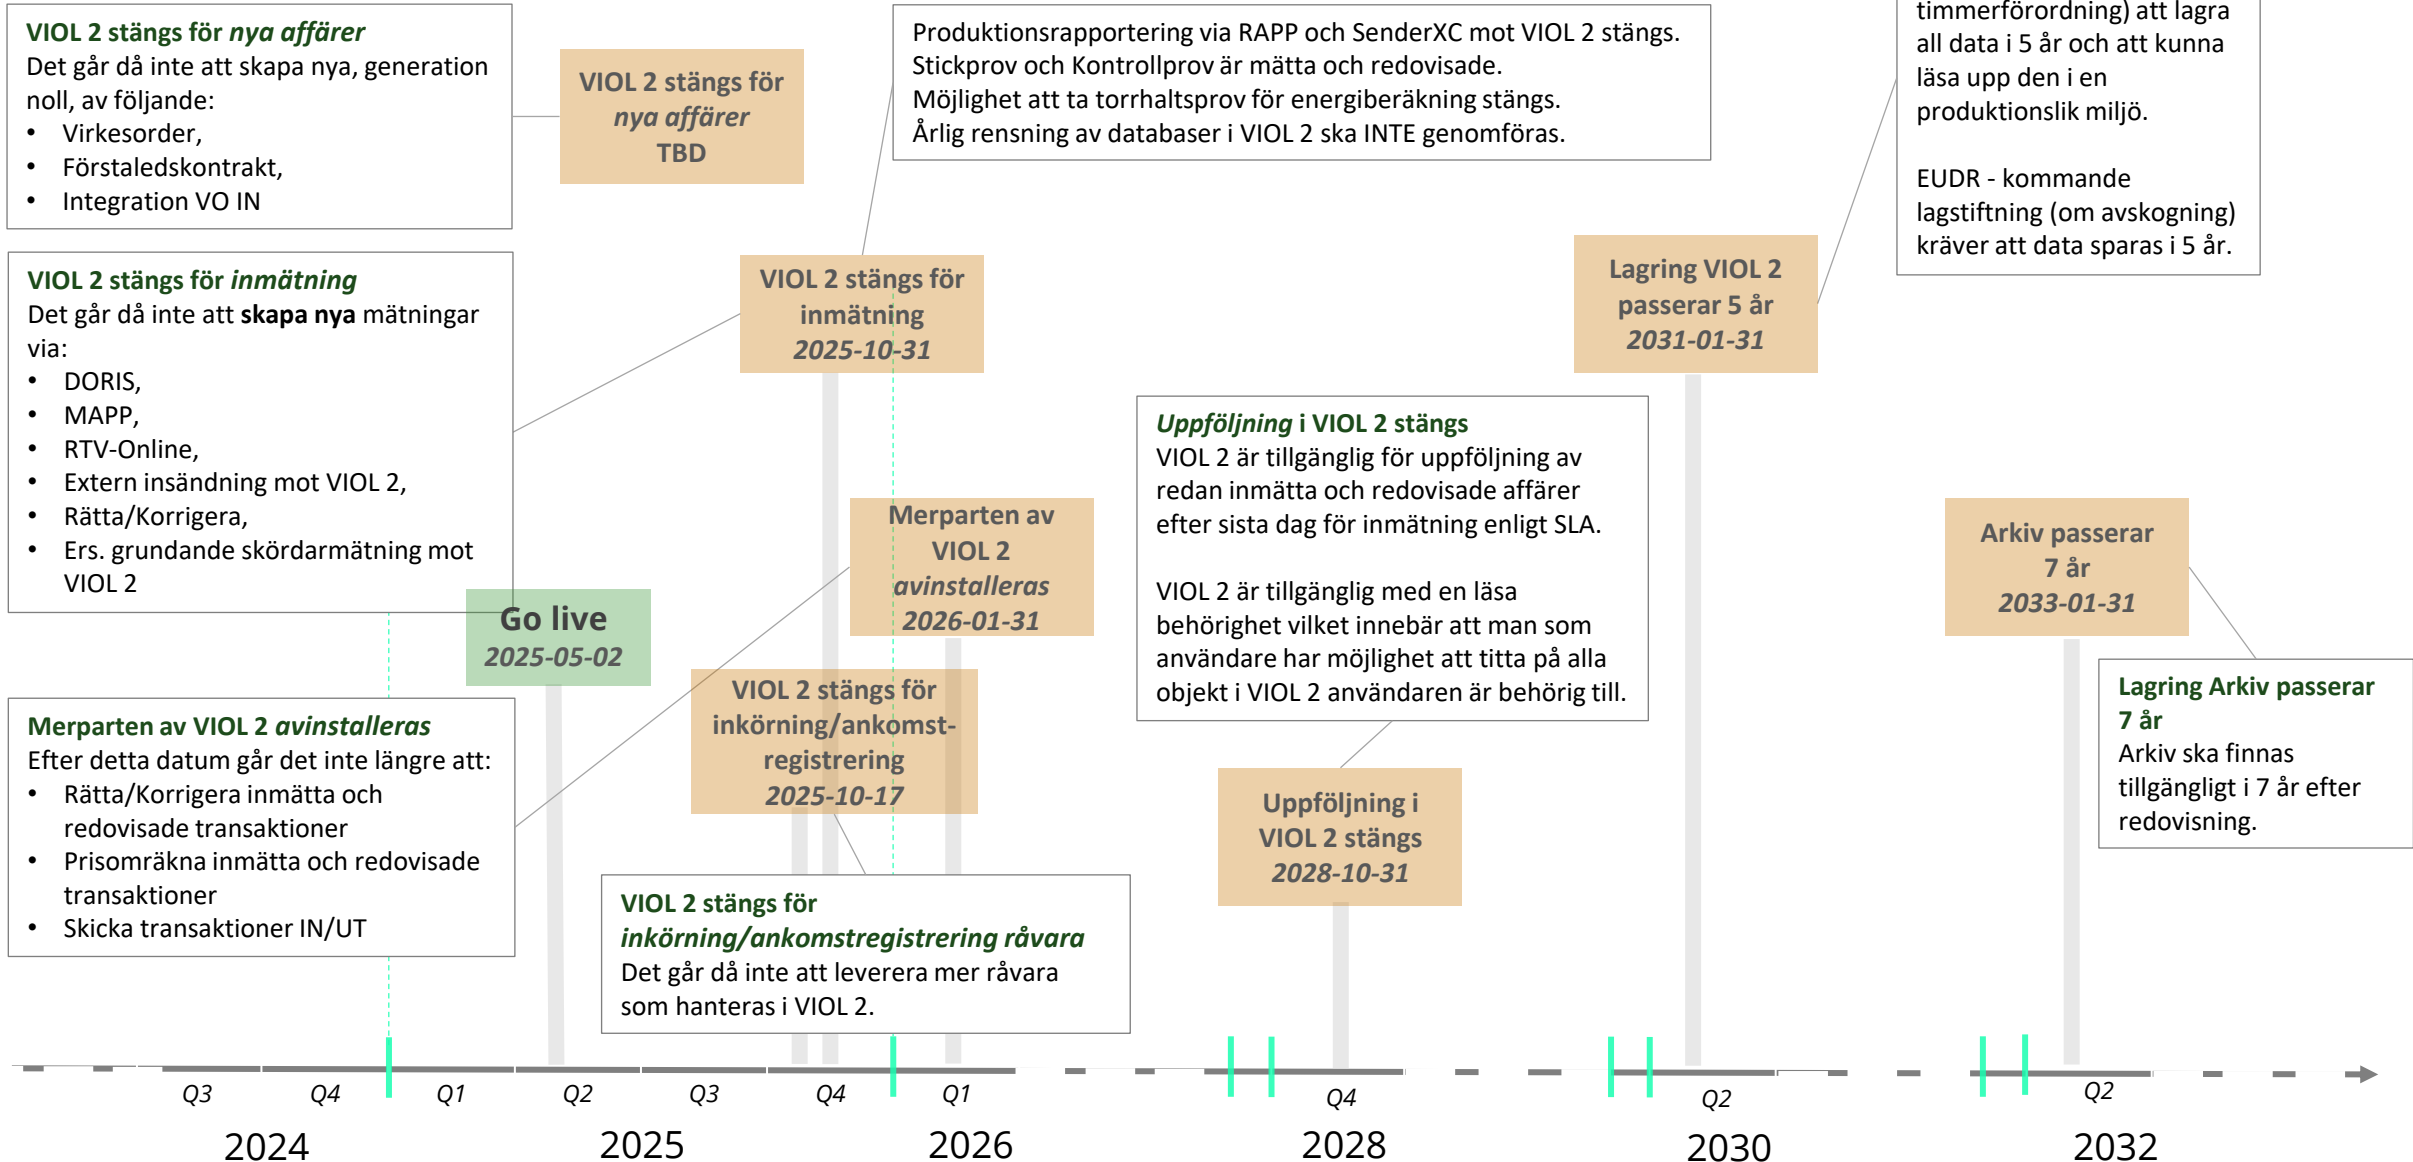



## Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 1 av 2

Milstolpe	Beskrivning	Datum
Stäng VIOL 2 för nya affärer	Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN Det går fortsatt att lägga till nya rader i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i transportaffären.	TBD
Sista dag för inkörning/ankomstregistrering	Sista dag för leveranstillfällen av råvara för VIOL 2 Det innebär att mätningorganisationen har 2 veckor att slutföra mätningar för VIOL 2	2025-10-17
Stänga VIOL 2 för inmätning	Det går då inte att skapa nya mätningar via: <ul style="list-style-type: none"><li>• DORIS,</li><li>• IRIS (fjärrmätning)</li><li>• MAPP,</li><li>• RTV-Online,</li><li>• Extern insändning,</li><li>• Rätta/Korrigera,</li><li>• Ers. grundande skördarmätning</li></ul> Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs. Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade. Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs. Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE genomföras	2025-10-31
Möjlighet att rätta/korrigera inmätta och redovisade transaktioner stängs	Det går då inte att: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rätta/Korrigera inmätta och redovisade transaktioner</li><li>• Prisomräkna inmätta och redovisade transaktioner</li><li>• Skicka transaktioner IN/UT</li></ul>	2026-01-31



## Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 2 av 2


Milstolpe	Beskrivning	Datum
Uppföljning i VIOL 2 stängs	<p>VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer efter sista dag för inmätning enligt SLA.</p> <p>VIOL 2 är tillgänglig med en läsa behörighet vilket innebär att man som användare har möjlighet att titta på alla objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.</p>	2028-10-31
Lagring VIOL 2 passerar 5 år	<p>EU krav (EUs timmerförordning) att lagra all data i 5 år och att kunna läsa upp den i en produktionslik miljö.</p> <p>EUDR - kommande lagstiftning (om avskogning) kräver att data sparas i 5 år.</p>	2031-01-31
Lagring Arkiv passerar 7 år	<p>Arkiv ska finnas tillgängligt i 7 år efter redovisning enl bokföringslagen.</p>	2033-01-31





**Inför och i samband med Go live**

# Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2

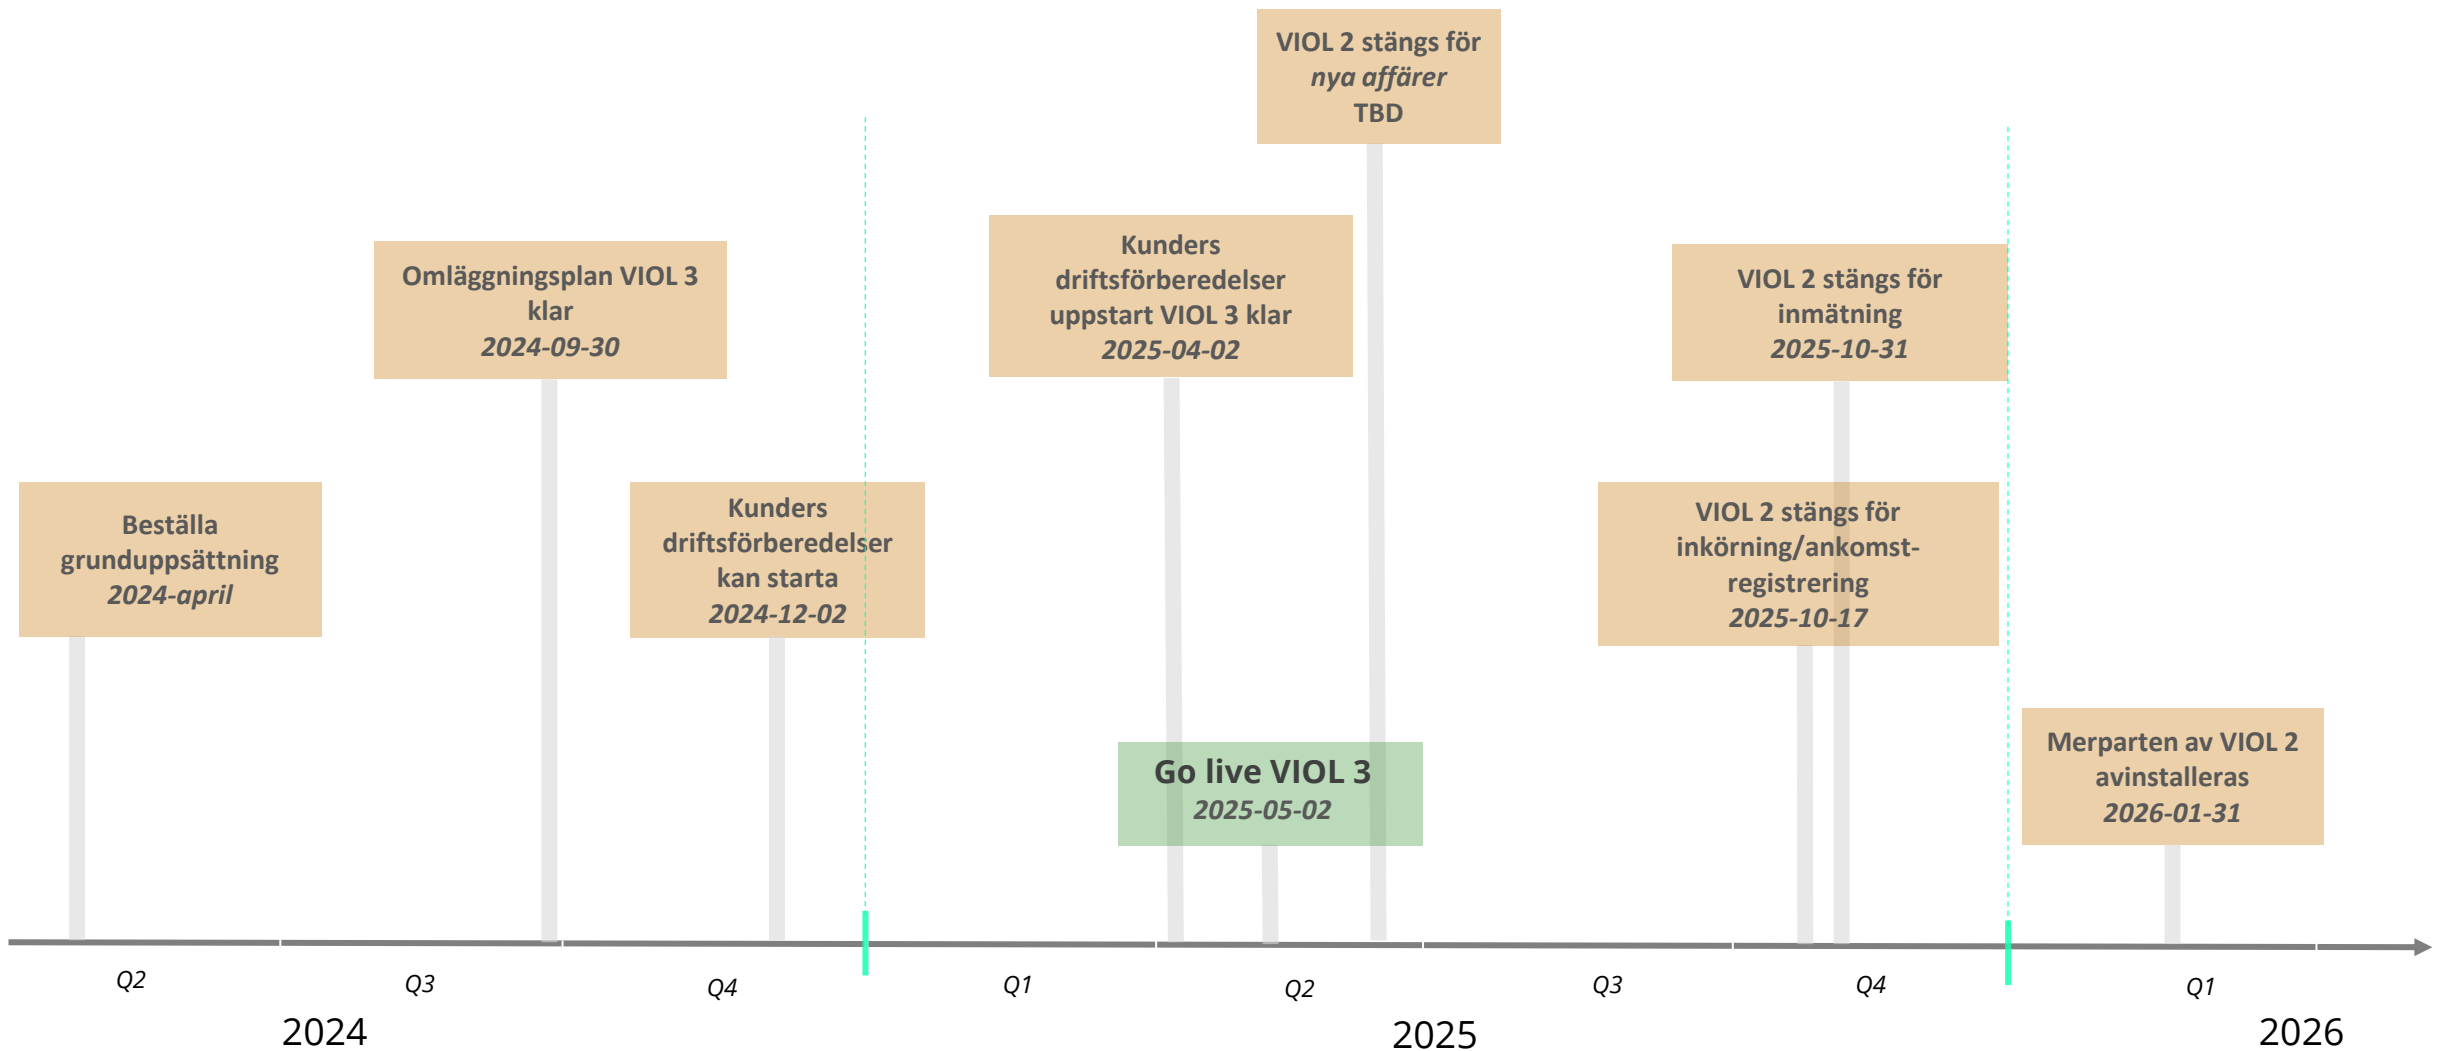



## Beställning av grunduppsättning | Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

- » Nedan listas vad du som kund ansvarar för att beställa av Biometria. Biometria ansvarar för att administrera dina beställningar
  - » Aktör – Organisationsstruktur
  - » Platsstruktur
  - » Företagsspecifika och/eller sitespecifika sortiment
  - » Integrationskontrakt
  - » Behörigheter till alla användare i VIOL 3
  - » Mättingsflöden och Mätningstjänster
  - » Prislisterabonnemang
  - » Kollektiv
  - » Certikonto
- » Information om när och hur beställningar för grunduppsättning görs till VIOL 3 kommer att publiceras ca två veckor innan möjligheten öppnas

Möjligheten att beställa  
behörigheter,  
grunduppsättning data och  
integrationer kommer vara  
möjlig **under april 2024**





## Omlägningsplan VIOL 3

Omlägningsplanen är milstolpe 7a i Forest Storms milstolpeplan. Omlägningsplanen ska beskriva hur era affärer ska förflyttas från VIOL 2 till VIOL 3. Biometria kommer tillhandahålla mall för omlägningsplan under april 2024

- » Vilka affärer planeras att slutföras i VIOL 2?
- » Vilka affärer ska starta direkt i VIOL 3?
- » Vilka affärer behöver läggas upp på nytt i VIOL 3 då de inte hinner slutföras i sin helhet i VIOL 2?
- » Vilka affärspartners jobbar ni med?
- » Hur ligger dina affärspartners till i omlägningsarbetet VIOL 3?
- » Vilka roller har jag i förhållande till mina affärspartners? Köpare, mottagare, säljare, befraktare, annat?



# Kunders driftsförberedelser

- » Samtliga kunder som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in 2024-12-02 i produktionsmiljön VIOL 3
- » Det ges då möjlighet skapa sina affärsdata, så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor osv.
- » All affärsdata administreras manuellt i klienten, ingen maskinell migrering från Biometrias kundtestmiljö är möjlig
- » För att möjliggöra kommunikation med dina affärspartners till Go live VIOL 3 bör du vara färdig med skapandet av initiala affärer 2025-04-02. Med initiala affärer avses affärer som startar i VIOL 3 vid eller efter Go live
- » Följande integrationsfunktioner till och från egna system kommer att vara möjliga att använda:
  - » Begärd utskick av befintligt data/UT
  - » Aktör UT
  - » Plats UT
  - » Sortimentstruktur UT
  - » Köparekontrakt IN/UT
  - » Kontraktskedja UT
  - » Redovisningshänvisning UT
  - » Förstaledskontrakt IN/UT
  - » Avtalsobjekt IN/UT
  - » Destineringsunderlag/UT



## Go live VIOL 3 | 2025-05-02

- » Funktionalitet är tillgänglig för att genomföra affärer i VIOL 3
- » Viktigt är att **så snart som möjligt förflytta** din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3
- » Samtliga affärer kan destinerar, produktionsrapporteras, transportstyras, leveransavisering, mätas, redovisas, följas upp mm
- » Alla typer av integrationsfunktioner IN/UT är nu tillgängliga





# Kontaktvägar

- » Biometrias Kundservice [support@biometria.se](mailto:support@biometria.se) eller 010-228 59 00
- » Din affärskonsult i Forest Storm



